





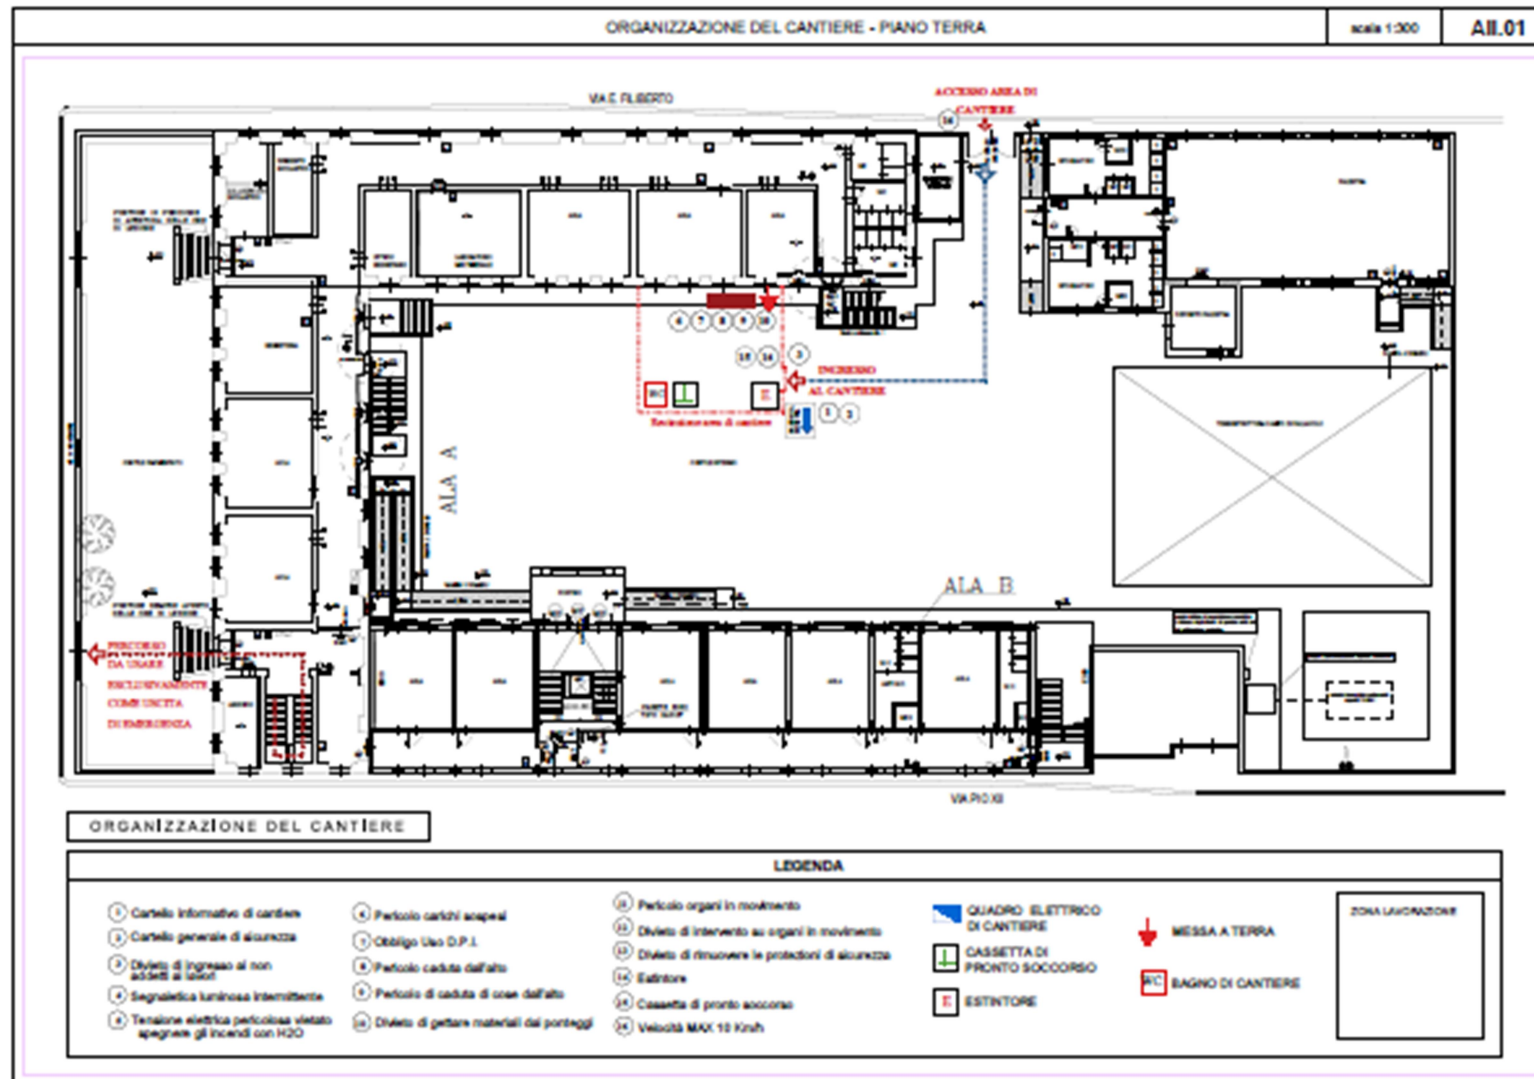

- Indicazioni e specifiche -

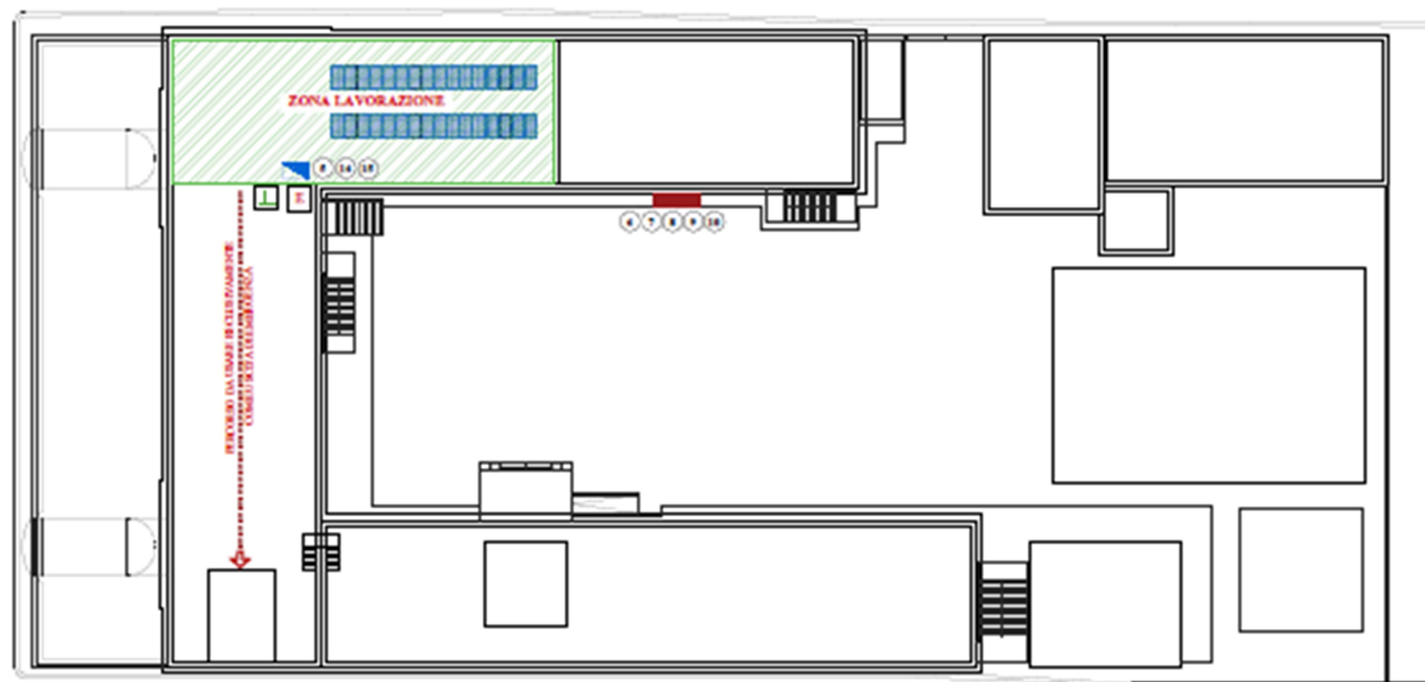

Nell'impossibilità di poter utilizzare un bagno del fabbricato oggetto dei lavori, si dovrà installare idoneo servizio igienico di cantiere munito di igienizzante e sistema di lavaggio delle mani di cantiere o dovrà essere stipulata apposita convenzione con il locale pubblico più vicino.



In corrispondenza dei luoghi di transito ed all'esterno dovranno essere installate idonee recinzioni di protezione o in alternativa le chiusure continue delle facciate con griglia di protezione, in caso di mancata attuazione, si dovrà segnalare l'area sottostante, assicurando il passaggio, con idonea segnaletica collegata da filo con nastri a bande bianche e rosse, in maniera tale da evitare l'area di possibile caduta di materiale.

Se al posto per la segregazione dell'area esistente il portello sarà sufficiente l'area di possibile caduta dei materiali da portello di lavoro esistente, dovranno essere disposte idonee segnaletiche e nastri bianchi e rossi, collegati da filo con nastri a bande bianche e rosse, o sistemi di perimetrazione che impediscano completamente al passaggio un'area entro il portello.



INFORMAZIONE

ESPOSIZIONE DAVANTI ALLA
RISERVAZIONE DI CANTIERE

cartello informativo
cartello generale di
sicurezza



TENERE SOLLICITATI DA
TERRA I CAVI ELETTRICI

L'arrivo dei mezzi in cantiere per il carico e lo scarico dei materiali dovrà essere preceduto da una segnalazione con l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli e del personale addetto alle lavorazioni.

Almeno una volta al giorno, in orario di lavoro, dovranno essere

effettuati i controlli di sicurezza delle aree di lavoro e delle attrezzature dei mezzi e dei materiali, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti e la presenza di materiali pericolosi.

Nei casi in cui l'attività di lavoro sia preceduta da una segnalazione con l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli e del personale addetto alle lavorazioni, dovranno essere installati dei dispositivi di segnalazione della sicurezza.

Tutti i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

ZONA LAVORAZIONE E STOCCAGGIO

Per la Zona di lavoro e di stoccaggio, essendo limitate le aree di stoccaggio e lavorazione, i materiali che giungeranno in cantiere saranno direttamente portati al piano superiore utilizzando idonei mezzi di sollevamento prima delle ore 7:00 del mattino o dopo le ore 18:00.
